KOMA

La Chaux-de-Fonds
MÉTROPOLE HORLOGÈRE

Refonte du

Site web

Réponse à l'appel d'offres

chaux-de-fonds.ch

Pourquoi La Chaux-de-Fonds mérite mieux qu'un simple site web ?

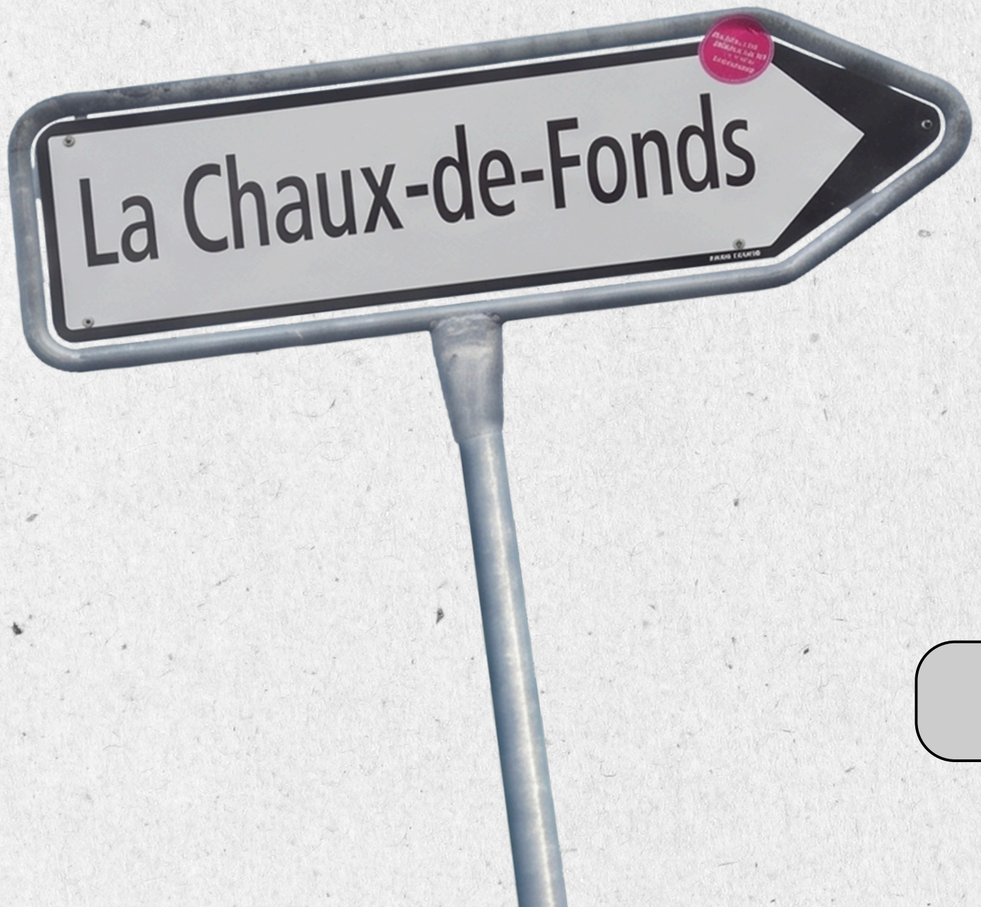

Simplifier & digitaliser

Services publics & Institutions

Favoriser le tourisme

Horlogerie

Patrimoine UNESCO

38'000 habitants

Sommaire

Notre plan d’action

1. Analyse de l’audience
2. Audit UX & besoins utilisateurs
3. Maquettes du site
4. Solutions techniques
5. Organisation & gouvernance
6. Offre & budget
7. Support & maintenance
8. Planning Gantt
9. Vos questions

Analyse de l'audience

Une audience significative à valoriser

Janvier 2025

123'098 **33'981**

Mars 2025

104'102 **30'179**

Mai 2025

96'856 **28'466**

Parcours utilisateur

Cartographie des flux de navigation des utilisateurs afin d'identifier la friction

Parcours utilisateur

unesco

Parcours utilisateur

Parcours utilisateur

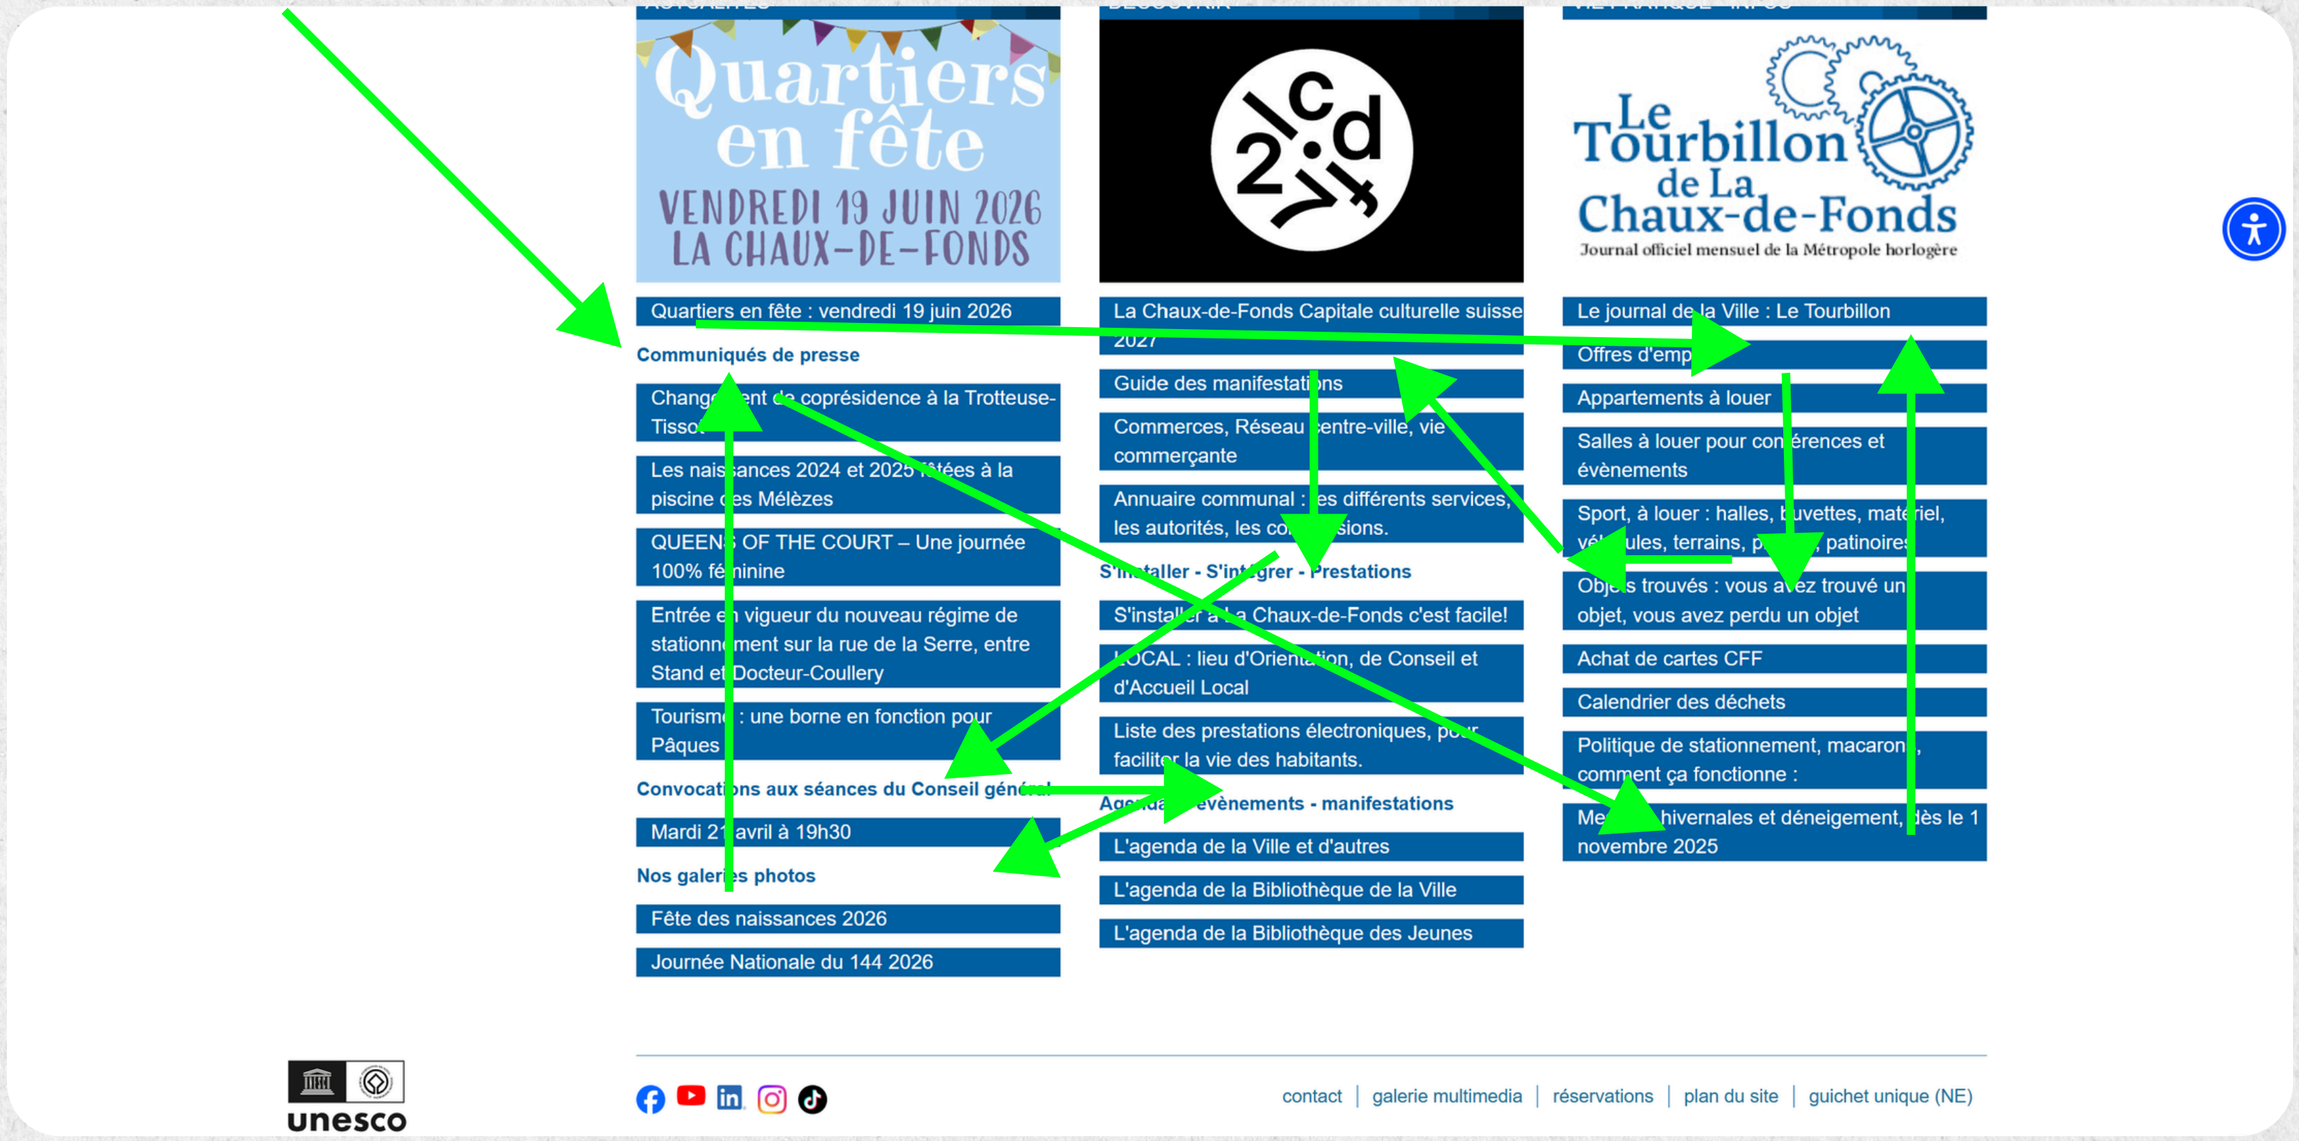

Audit UX

Identification des points de friction



Navigation peu intuitive

Interface visuelle datée

Architecture de l’information complexe

Volume élevé de pages, information dispersée

Absence de gouvernance éditoriale claire

Lorem Ipsum

Contenus de test accessibles en recherche

Sondage citoyens

Comprendre les attentes réelles des citoyens pour orienter les choix UX

- À quelle **fréquence** consultez-vous le site de la Ville ?
- Pour quelles **raisons principales** utilisez-vous le site ?
- Avez-vous déjà **renoncé à une démarche** en raison d'un manque de clarté ?
- Sur **quel appareil** consultez-vous principalement le site (ordinateur, mobile, tablette) ?
- Quelle **fonctionnalité ou service vous manque** le plus sur le site actuel ?
- Quelles informations ou services **consultez-vous le plus fréquemment** ?

...

User stories

Traduction des besoins utilisateurs en cas d’usage

Citoyens

- En tant que citoyen, je veux **trouver rapidement une démarche administrative** afin de gagner du temps
- En tant que citoyen, je veux accéder à des **informations claires et à jour** afin d’éviter les erreurs
- En tant que citoyen, je veux **naviguer facilement sur mobile** afin d’accéder aux services partout

Visiteurs / nouveaux habitants

- En tant que visiteur, je veux **consulter les événements** afin d’organiser mon séjour
- En tant que nouvel habitant, je veux **découvrir les services locaux afin de m’intégrer** rapidement

Acteurs institutionnels

- En tant qu’élu, je veux **accéder aux documents officiels** afin de suivre les activités du conseil
- En tant que journaliste, je veux **télécharger les communiqués** afin de relayer l’information

Contributeurs & administrateurs

- En tant que contributeur, je veux **publier facilement du contenu** afin de le maintenir à jour
- En tant qu’administrateur, je veux être en mesure de **structurer les contenus afin d’éviter les doublons**

Personas UX

Orientation des choix de design selon les besoins des groupes d’utilisateurs

Persona	Profil	Besoin principal
Léa, 34 ans	Citoyenne résidente	Trouver rapidement une démarche administrative
Marco, 58 ans	Élu municipal	Accéder aux documents privés du Conseil général
Sofia, 27 ans	Nouvelle résidente	S'intégrer, connaître les services locaux
Simon, 42 ans	Journaliste local, Média régional	Télécharger des communiqués de presse et des ressources médias
Jean, 66 ans	Retraité peu à l’aise avec le numérique	Accéder facilement à des informations claires sans se perdre dans le site

Transformer ces constats en solution

KOMA

KEEP OPEN MIND ALIVE

Ligne directrice de nos projets web :

1. Centré sur l'utilisateur
2. Simplicité, accessibilité, créativité
3. Suivi & amélioration continue

Concrètement, ça donne quoi ?

Maquettes

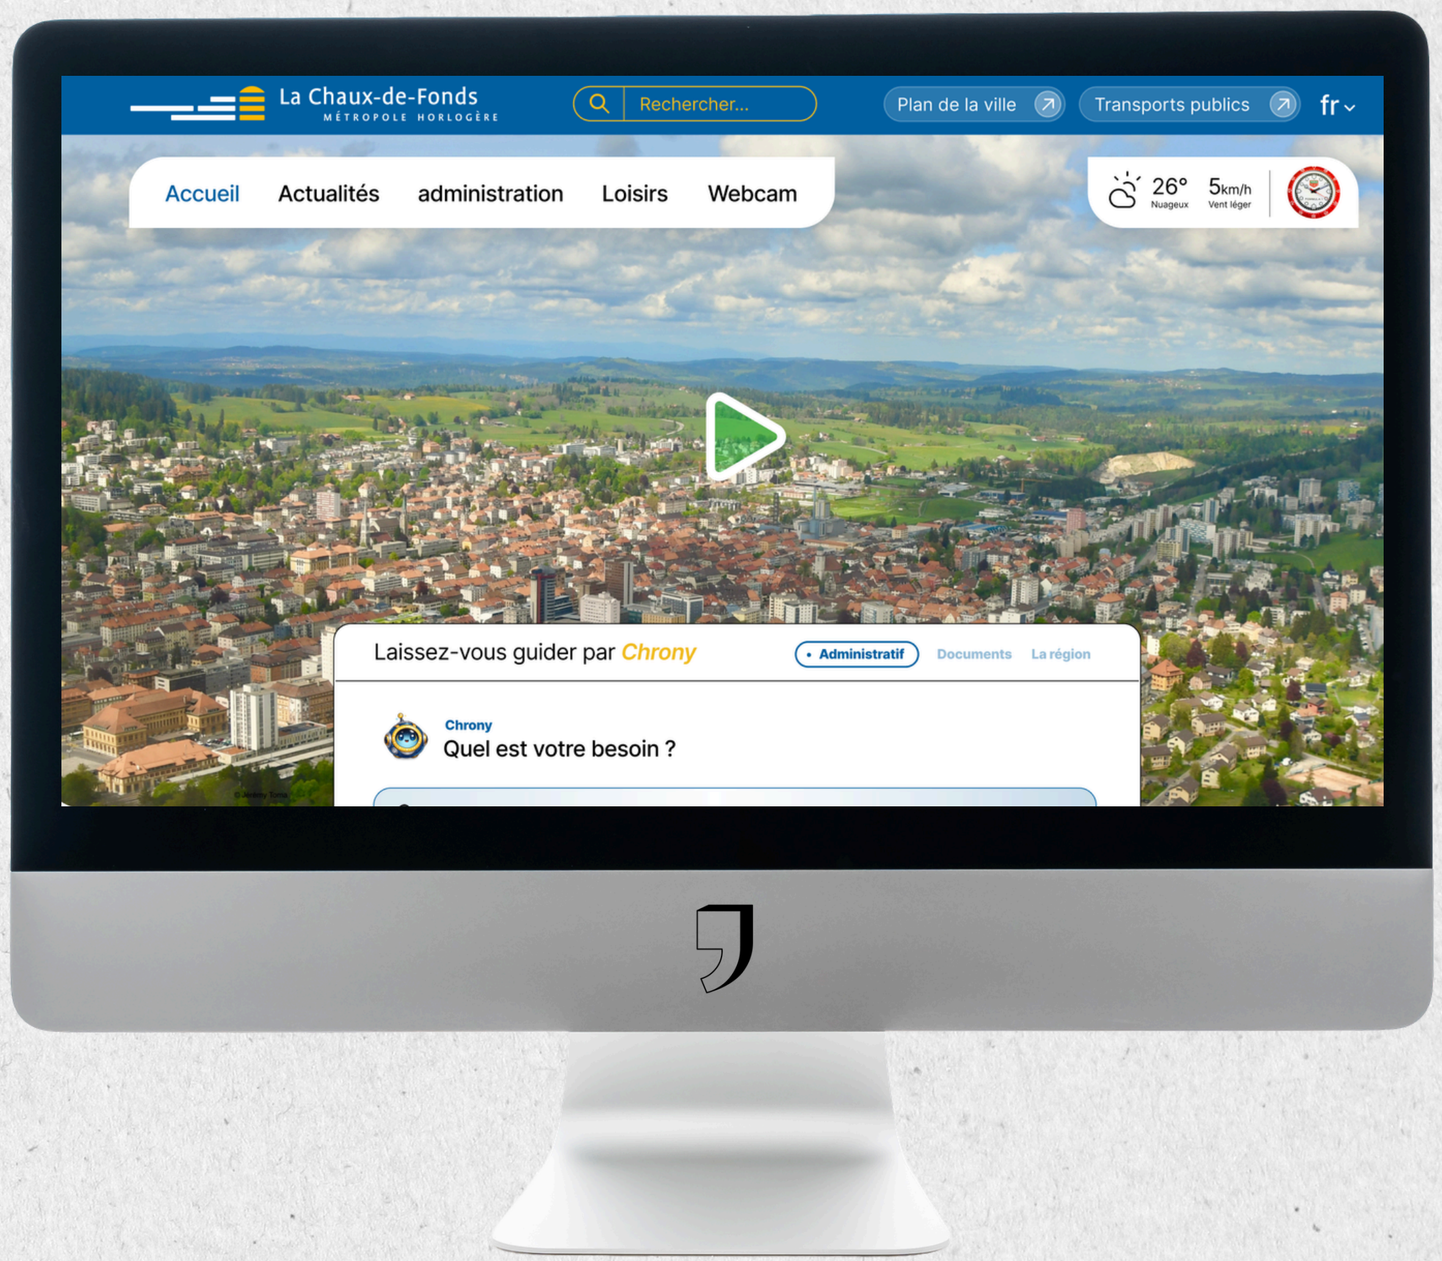

Accueil

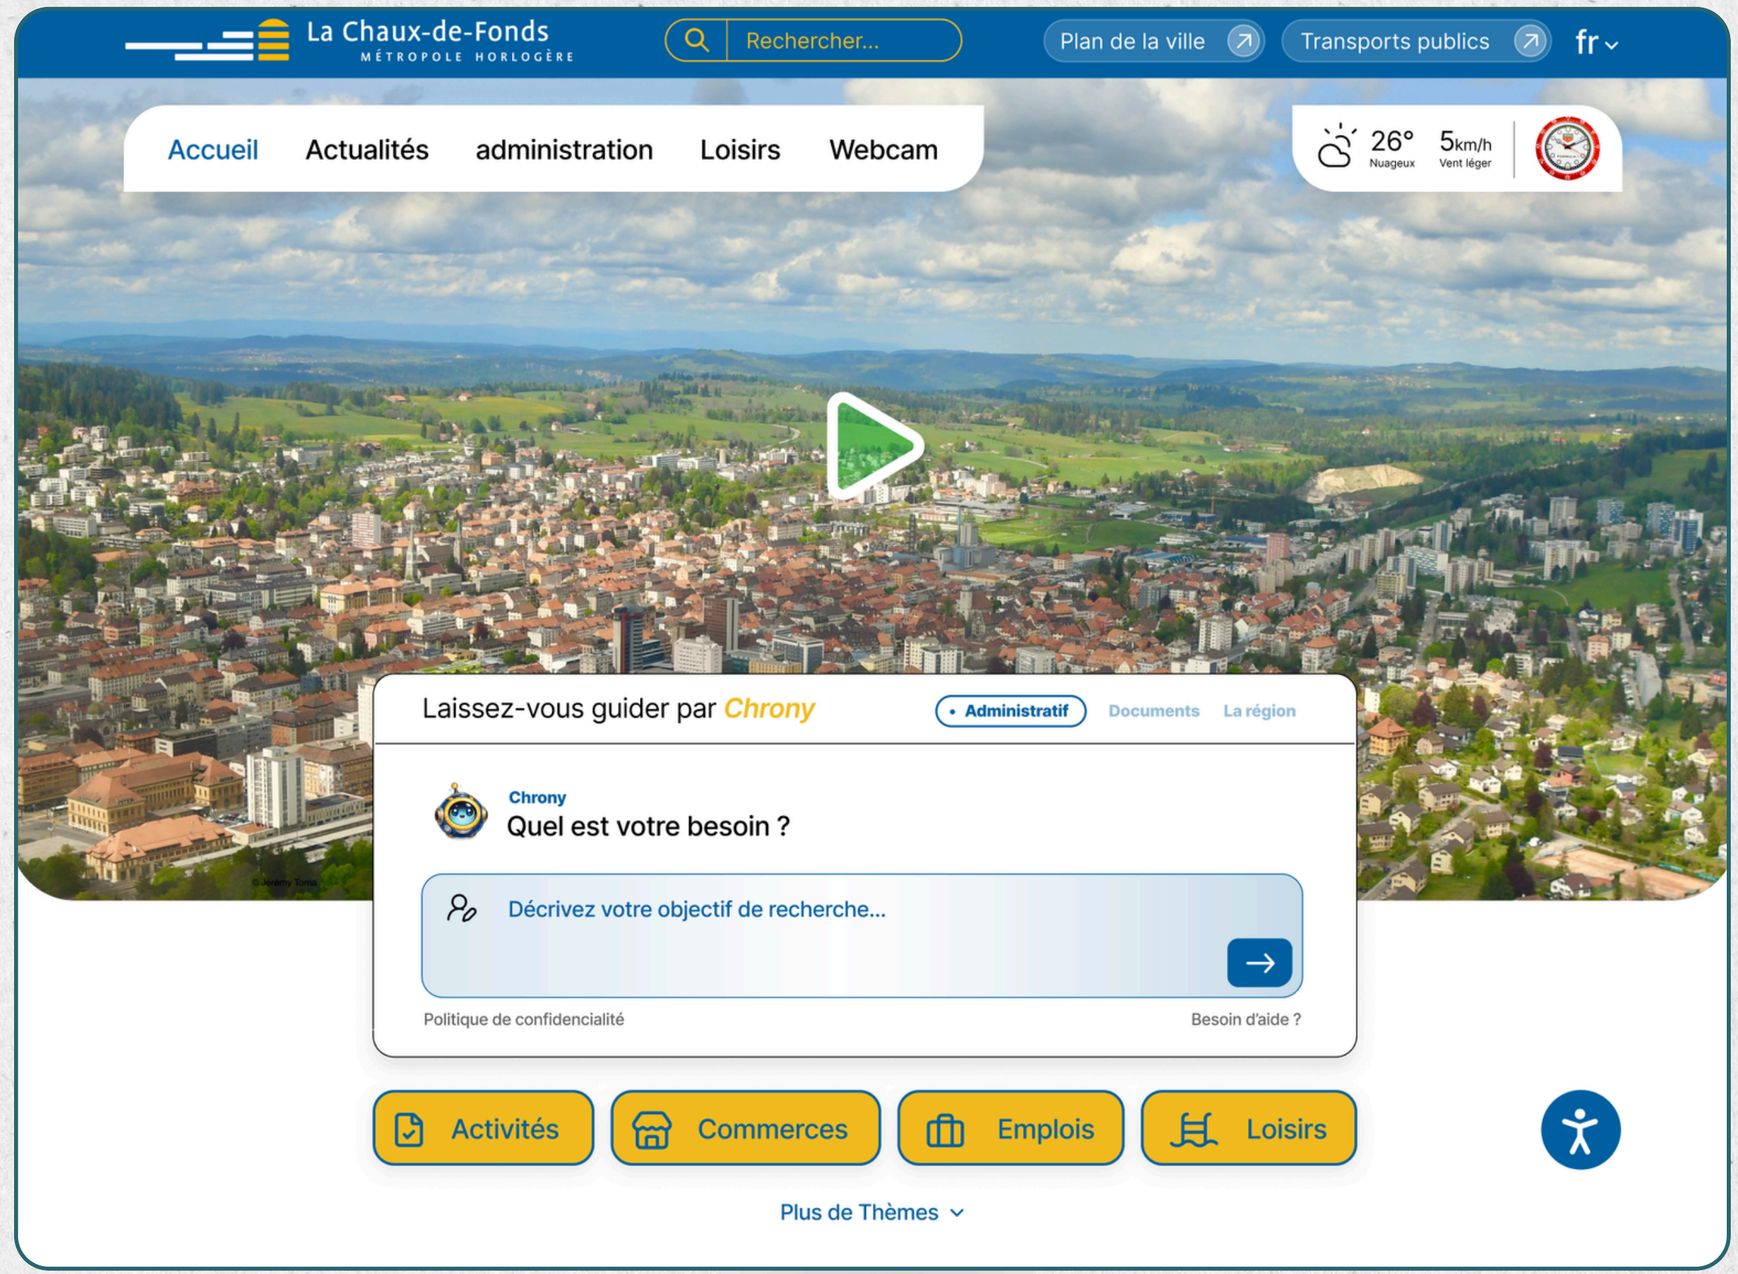

Navigation

Tourisme



Vidéo drone

IA

Chrony

Thèmes

WCAG 2.2

Découvrir la région

Offre culturelle

Administration



Événements

Événements à venir à la Chaux de Fonds

Articles

Suivez toute l'actualité

01.03.2026

Accueil > Événements

Marche du 1er mars 2026

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc eu tellus ut turpis dignissim lacinia nec vel turpis. Aenean augue magna, lobortis ac consectetur vel, aliquet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc eu tellus ut turpis dignissim lacinia nec vel turpis. Aenean augue magna, lobortis ac consectetur vel, aliquet vitae tellus. Etiam

Parcours utilisateurs

Rubriques utiles

Thématiques

- Musées
- Police, secours
- Écoles
- Parkings
- Environnement
- Bien-être

Administration

- Horaires d'ouverture
- Documents
- Contact en ligne
- Ligne téléphonique

Liens utiles

- Espace médias
- Événements
- Articles de presse
- Agence du tourisme
- Offre culturelle

Accessibilité

- Plan du site
- Gestion des cookies
- Base légales
- Mises à jour

Suivez-nous sur les réseaux :

Maquette chaux-de-fonds.ch - Tous droits réservés

Flux de recherche



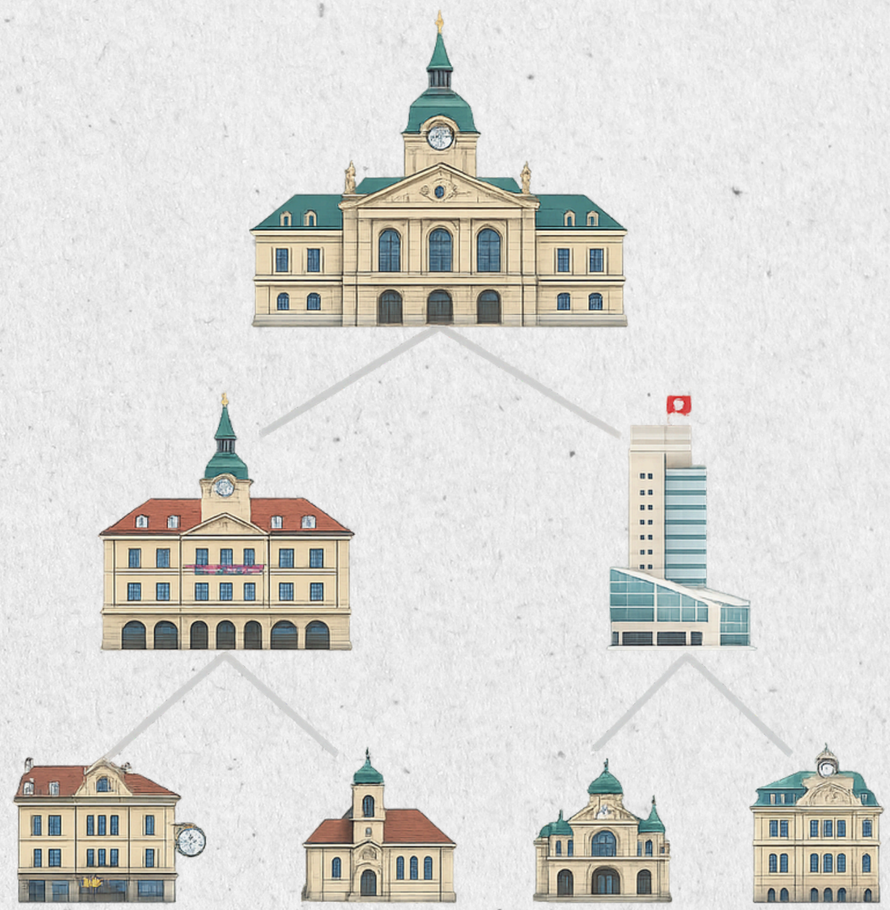

Stack technique

Écosystème open source

État de Neuchâtel
SIEN

Backend

Roles user
Hiérarchie / validation

php 8.5

eco Index

matomo

API Headless

Frontend

React

GSAP

WCAG

Sites satellites

Architecure en constellation

Backend centralisé
Architecure en constellation

Rôles users
Chacun gère son “étoile”

Gouvernance centrale
Gabarits, Menus, API, Taxonomie, SEO, IA

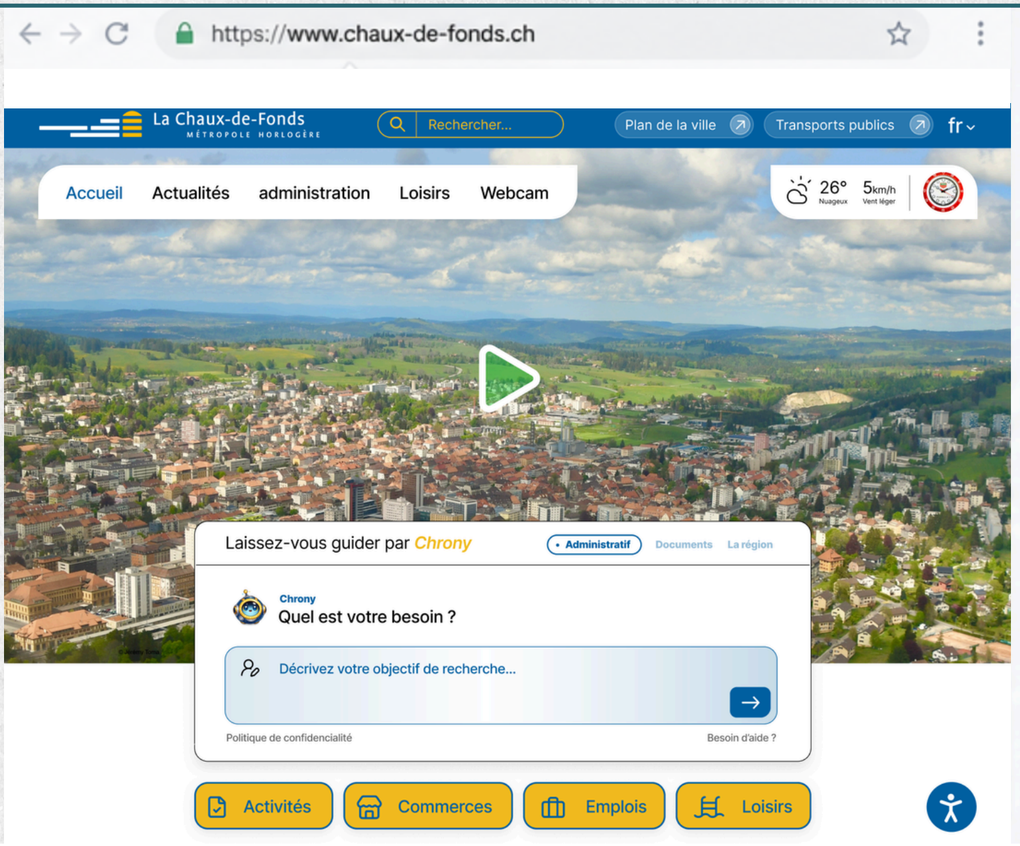

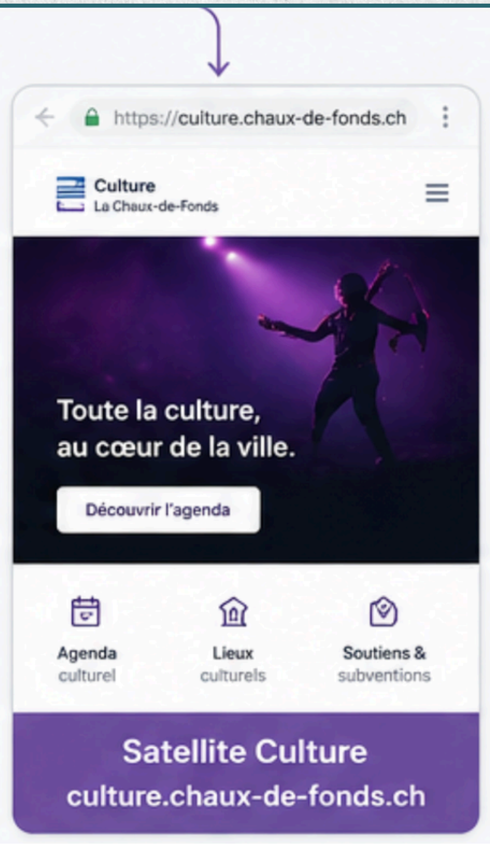

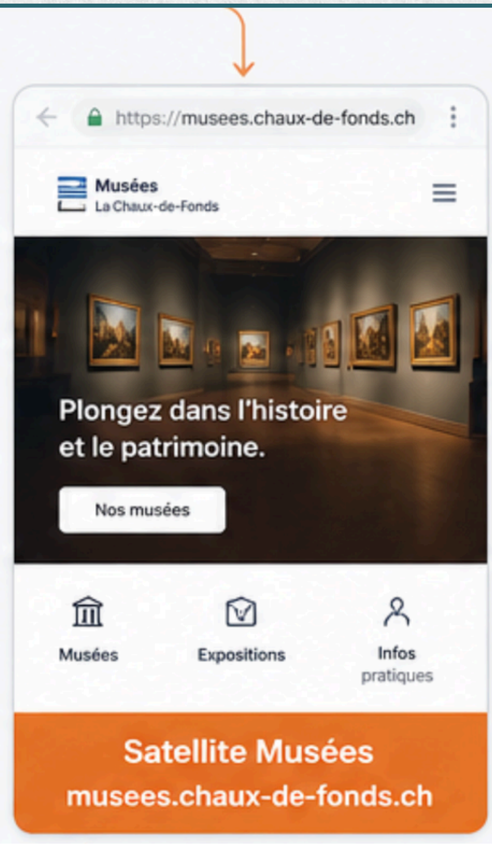

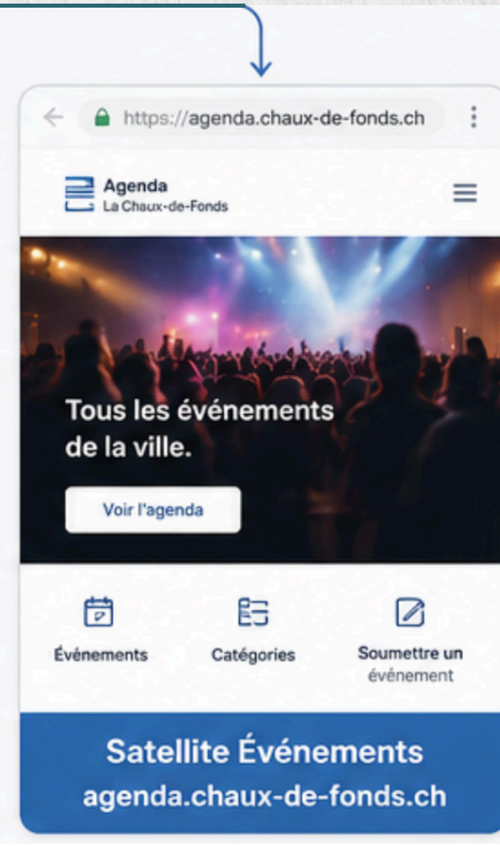

Migration du contenu

Rationalisation, structure, migration et archivage

Rationalisation

Périètre de migration

Migration automatisée

CSV, JSON, Media

Structuration

Structure des contenus Drupal

Optimisation

Validation

SEO

Archivage

Années

Fonctionnalités

Plugins Drupal & Développement spécifique

Cookies Consent Management

Agenda dynamique

Prise de RDV

Formulaires & sondages

Newsletter Brevo (RGPD), Migration contacts

API (Culturoscope, transports, météo, etc.)

Formation & Documentation

doc.chaux-de-fonds.ch

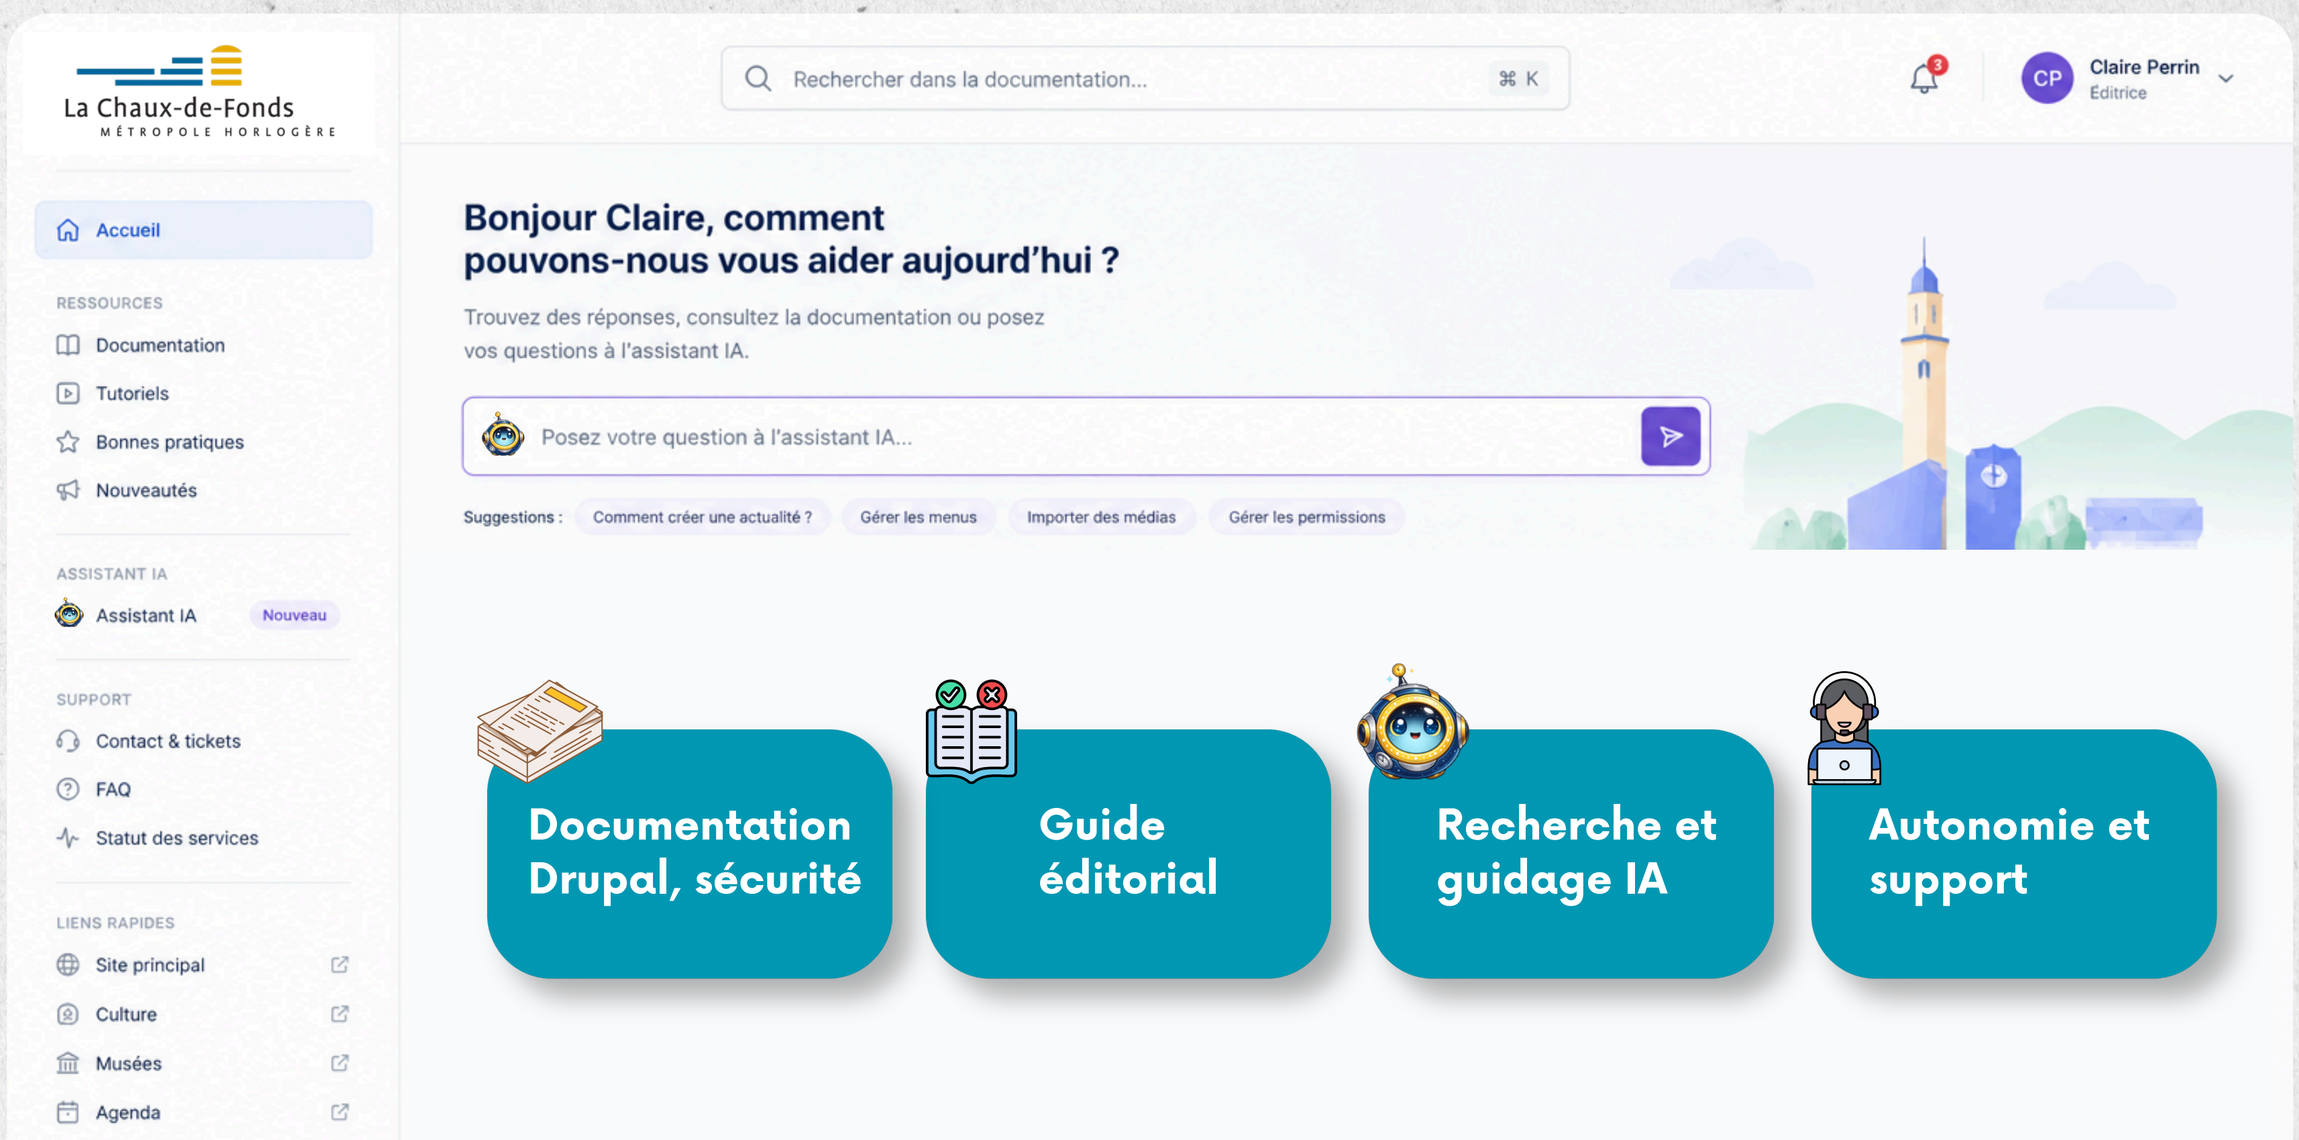

Gouvernance

Répartition des rôles et pilotage du projet

Ville de la Chaux-de-Fonds

- Vision & validation
- Priorisation des besoins
- Validation des livrables

KOMA Agency

- Pilotage & coordination
- Conception & développement
- Qualité & performance

Organisation et suivi

- Points réguliers
- Démonstrations
- Ajustements continus

Backlog

Priorisation des fonctionnalités

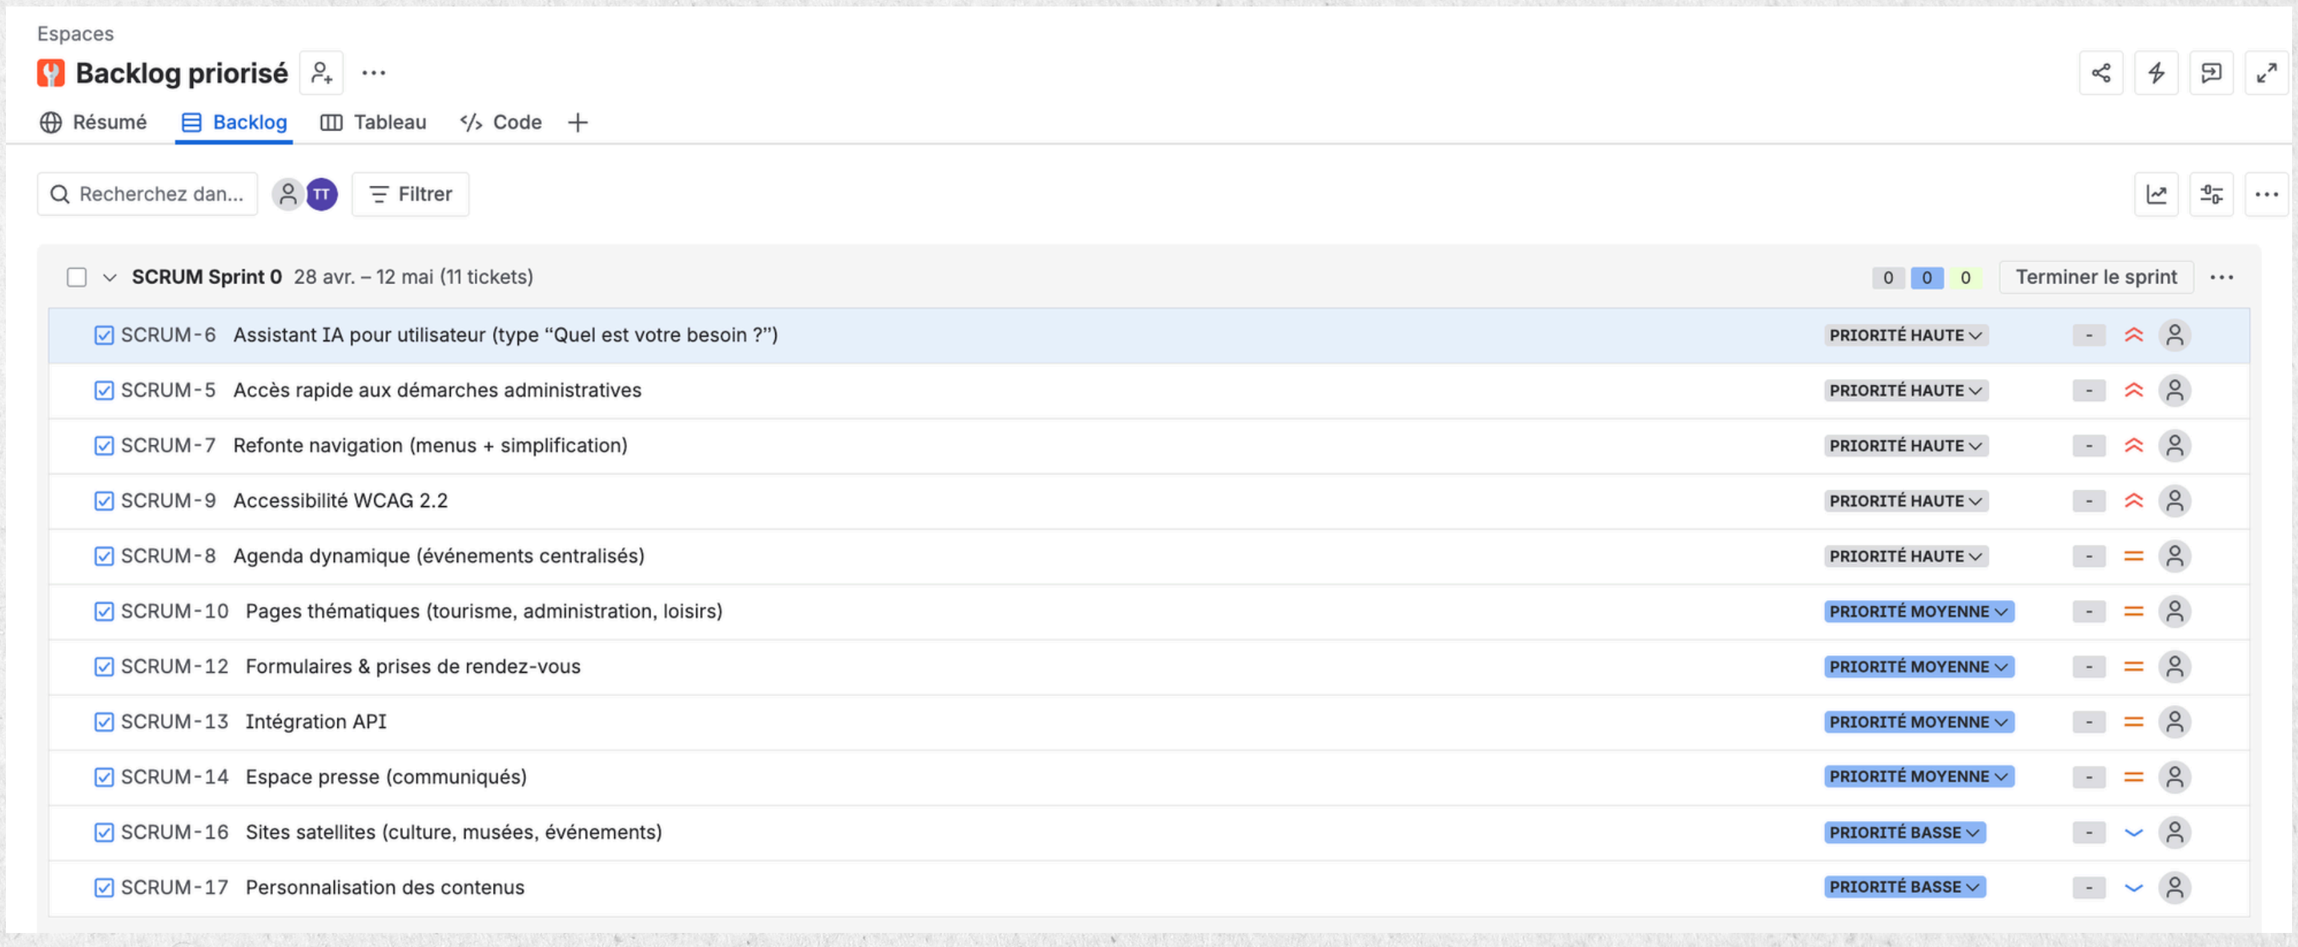

Matrice RACI

Phase 1 - Stratégie

Annexes :

Phase 2 - UX/UI

Phase 3 - Développement

Phase 4 - Performance

Phase 5 - Maintenance

	Teicir Bouazizi **Cheffe de projet**	Gabriel Cappai **Développeur**	Nuno Amaro **UX/UI**	Sasita Hobi **Rédacteur Web**	Tanguy Vaucher **DevOpps - Expert Sécurité - Teseur**	Ville de la Chaux-de-Fonds
Analyse du site & KPI	A	C	C	R	C	I
Audit technique & SEO	C	R	C	R	A	I
Définition stratégie & vision	A	C	R	R	C	A
Personas & parcours utilisateurs	C		R	A		I
Arborescence & architecture info	A	C	R	C		A
Gouvernance éditoriale	A		C	R	C	I

RESPONSIBLE

ACCOUNTABLE

CONSULTED

INFORMED

Matrice des risques

Risque	Probabilité	Impact	Mesures de mitigation
Retards de validation	Moyenne	Moyen	Jalons clairs, livrables intermédiaires, suivi régulier
Contraintes techniques SIEN	Moyenne	Moyen	Tests anticipés, coordination SIEN
Risques liés à la migration	Moyenne	Élevé	Plan de migration, redirections 301, tests et sauvegardes
Performance du site	Moyenne	Élevé	Tests de charge, cache, optimisation front/back
Protection des données	Faible	Élevé	Droits d'accès, minimisation des données, audit sécurité
Dépassement budget / planning	Moyenne	Faible	Suivi des charges, backlog priorisé, méthode agile

Devis & Budget

KOMA

Offre commerciale

Refonte du site web · Ville de La Chaux-de-Fonds

Réf. KOMA-2025-LCDF-001 · 01.05.2026 · Valable 30 jours

DESTINATAIRE

Ville de La Chaux-de-Fonds

koma.ch · contact@koma.ch

Durée estimée : 8 à 9 mois

PRESTATIONS PAR PHASE

PHASE	DESCRIPTION	MONTANT HT (CHF)
Phase 1	Stratégie & Audit	**CHF 12'600**
Phase 2	Design & Conception UX / UI	**CHF 41'900**
Phase 3	Développement & Implémentation	**CHF 128'000**
Phase 4	Performance & Optimisation SEO	**CHF 9'200**
Sous-total HT		**CHF 191'700**

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

OPTION	TARIF HT (CHF)	DÉTAIL
Assistant IA personnalisé	**CHF 22'000**	LLM entraîné sur les services de la Ville
Vidéo drone (hero section)	**CHF 6'600**	Réalisation + intégration sur le site
Coaching individuel	**Sur devis**	Sessions personnalisées contributeurs / admins
Vidéos tutoriels CMS	**Sur devis**	Volume à définir ensemble

MODALITÉS DE PAIEMENT

- 30% à la signature du contrat
- 40% à mi-projet (fin Phase 2)
- 30% à la livraison finale

DÉLAIS & GARANTIE

- 8 à 9 mois (selon cahier des charges)
- Suivi & garantie 12 mois inclus

TOTAL HT

TVA 8.1% : CHF 15'528 · Total TTC : CHF 207'228

CHF 191'700

Support & Maintenance

Options de service & Monitoring

Phase 5 - Support & Maintenance

Support	Description	Prise en compte	Résolution
P0 — Critique	Site totalement inaccessible ou faille de sécurité majeure	4 heures ouvrées	**24 heures**
P1 — Majeure	Fonctionnalité principale dégradée, fort impact utilisateurs	8 heures ouvrées	**72 heures**
P2 — Mineure	Problème mineur, contournement possible	8 heures ouvrées	**1 semaine**

Maintenance corrective	Détail	Montant
Capacité mensuelle	4 jours × 1 000 CHF/jour	**4 000 CHF / mois**
Forfait annuel	4 000 CHF × 12 mois	**48 000 CHF**
Forfait sur 4 ans	Tarif fixe	**192 000 CHF**

Combiné : correctif + évolutif	Évolutive	Corrective	Total annuel	Total pour 4 ans
Essentiel	20'000	48'000	68000	272000
Standard	30'000	48'000	78000	312000
Avancé	40'000	48'000	88000	352000
Premium	50'000	48'000	98000	392000

Récapitulatif

Offre + maintenance correctif + évolutif (standard)

191'000 CHF + 312'000CHF = 504'000

Roadmap

Plan du projet

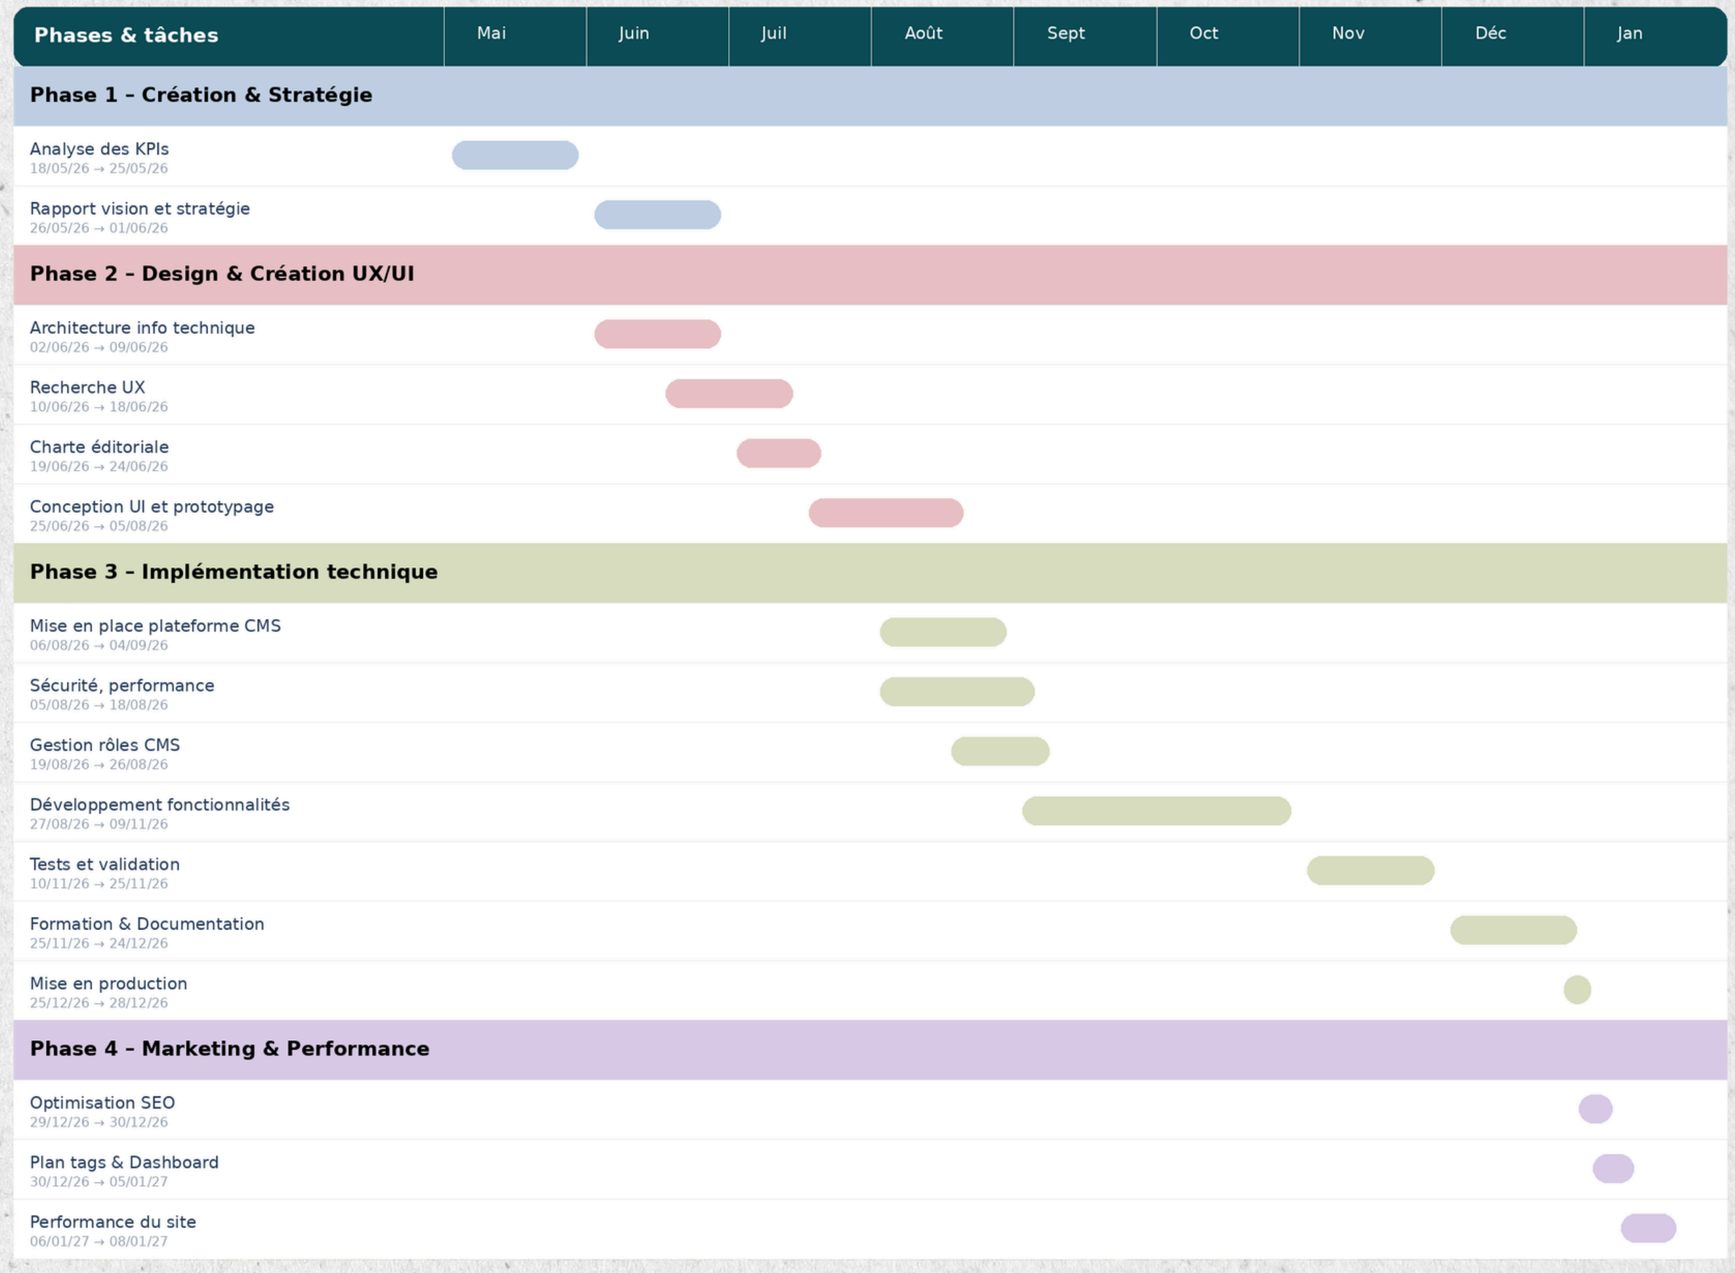

Début du projet : 18/05/2026

Fin du projet : 08/01/2027

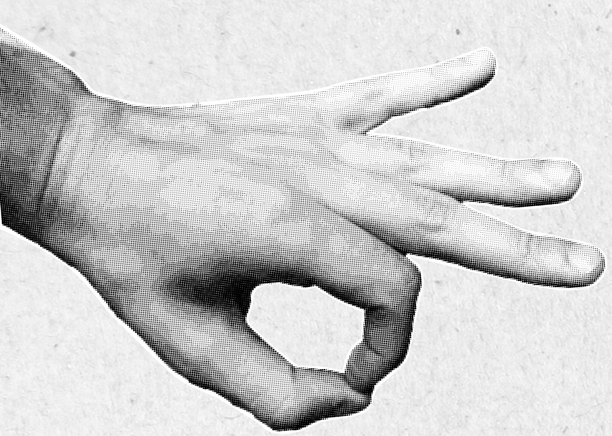

KOMA

L'équipe

Teicir Bouazizi

> Cheffe de projet

> Product Owner

Gabriel Cappai

> Développeur web

> Expert CMS

Nuno Amaro

> UX/UI designer

> Customer Experience

Sasita Hobi

> Rédactrice web

> Experte SEO & SEA

Tanguy Vaucher

> DevOps

> Expert en sécurité

> Testeur QA

On passe à l'action ?

La Chaux-de-Fonds

KOMA
KEEP OPEN MIND ALIVE

KOMA

Offre commerciale

Refonte du site web · Ville de La Chaux-de-Fonds

Réf. KOMA-2025-LCDF-001 · 01.05.2026 · Valable 30 jours

DESTINATAIRE

Ville de La Chaux-de-Fonds

koma.ch · contact@koma.ch

Durée estimée : 8 à 9 mois

PRESTATIONS PAR PHASE

PHASE	DESCRIPTION	MONTANT HT (CHF)
Phase 1	Stratégie & Audit	**CHF 12'600**
Phase 2	Design & Conception UX / UI	**CHF 41'900**
Phase 3	Développement & Implémentation	**CHF 128'000**
Phase 4	Performance & Optimisation SEO	**CHF 9'200**
Sous-total HT		**CHF 191'700**

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

OPTION	TARIF HT (CHF)	DÉTAIL
Assistant IA personnalisé	**CHF 22'000**	LLM entraîné sur les services de la Ville
Vidéo drone (hero section)	**CHF 6'600**	Réalisation + intégration sur le site
Coaching individuel	**Sur devis**	Sessions personnalisées contributeurs / admins
Vidéos tutoriels CMS	**Sur devis**	Volume à définir ensemble

MODALITÉS DE PAIEMENT

- 30% à la signature du contrat
- 40% à mi-projet (fin Phase 2)
- 30% à la livraison finale

DÉLAIS & GARANTIE

- 8 à 9 mois (selon cahier des charges)
- Suivi & garantie 12 mois inclus

TOTAL HT

TVA 8.1% : CHF 15'528 · Total TTC : CHF 207'228

CHF 191'700

Contexte général

Dans le cadre de l'appel d'offres public, nous proposons deux contrats de maintenance distincts pour le site internet de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Ces contrats sont séparés du contrat de refonte et sont proposés à tarif fixe sur une durée de 4 ans, renouvelable annuellement.

- **Maintenance corrective**: Démarre après la période de garantie de 12 mois suivant la signature du procès-verbal de livraison.
- **Maintenance évolutive**: Démarre dès la signature du procès-verbal de livraison.

PARTIE 1 — Maintenance Corrective

Périmètre du forfait mensuel (4 jours / 32 heures)

Ce forfait comprend les éléments suivants :

- Corrections de bugs selon les niveaux de priorité P0, P1, et P2.
- Mises à jour de sécurité du CMS (Drupal ou TYPO3) — environ 1 cycle par mois.
- Tests après chaque mise à jour (unitaires, intégration, non-régression).
- Déploiements sur 3 environnements (développement, préprod, production).
- Coordination et reporting : suivi des tickets JIRA, documentation, rapport mensuel.

Heures d'intervention

Les interventions seront réalisées du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00, hors jours fériés suisses. Les prestations seront réalisées depuis les locaux de l'agence via une connexion sécurisée à distance. Les jours non consommés ne sont pas reportables au mois suivant.

Délais de traitement garantis

Priorité	Description	Prise en compte	Résolution
P0 — Critique	Site totalement inaccessible ou faille de sécurité majeure	4 heures ouvrées	24 heures
P1 — Majeure	Fonctionnalité principale dégradée, fort impact utilisateurs	8 heures ouvrées	72 heures
P2 — Mineure	Problème mineur, contournement possible	8 heures ouvrées	1 semaine

Toute demande dépassant 4 heures de travail fera l'objet d'une validation préalable par la Ville.

Processus de traitement d'un incident

1. **Déclaration dans JIRA** — En cas de P0, compléter par un appel direct à l'agence.
2. **Accusé de prise en charge** dans le délai garanti.
3. **Diagnostic et proposition de solution**.
4. **Réalisation des corrections et tests**.
5. **Livraison en production** après validation par la Ville.
6. **Mise à jour de la documentation et rapport d'incident**.

Suivi et communication

- **JIRA**: Chaque demande est tracée, priorisée et suivie jusqu'à résolution.
- **Rapport mensuel**: Bilan des interventions, délais respectés, mises à jour effectuées.
- **Communication proactive**: La Ville est informée sans délai, sans relance nécessaire.

Chiffrage — Maintenance corrective

Élément	Détail	Montant
Capacité mensuelle	4 jours × 1 000 CHF/jour	4 000 CHF/mois
Forfait annuel	4 000 CHF × 12 mois	48 000 CHF
Forfait sur 4 ans (tarif fixe)		192 000 CHF

PARTIE 2 — Maintenance Évolutive

Périmètre

La maintenance évolutive comprend les améliorations et les nouveaux besoins identifiés par la Ville après la livraison du site. Ce contrat ne couvre pas les corrections de bugs. Le tarif unique est de 1 000 CHF/jour, fixe sur 4 ans.

Processus obligatoire pour chaque évolution

1. **Expression du besoin** documentée dans JIRA par la Ville.
2. **Devis de l'agence** (jours + coût + délai).
3. **Validation du devis** par la Ville.
4. **Priorisation** lors du comité de suivi.
5. **Intégration** dans le planning des mises en production.
6. **Conception, développement et tests**.
7. **Livraison en production et mise à jour de la documentation**.

Deux modes selon l'ampleur

Type	Seuil indicatif	Mode de traitement
Petite évolution	Moins de 5 jours	Intégrée dans le planning de mises en production régulières
Grande évolution	5 jours ou plus	Projet à part entière avec comité dédié et planning spécifique

Les 4 paliers d'enveloppe annuelle

Palier 1 — Essentiel · 20 jours · 20 000 CHF/an

Profil : Ajuster et affiner ce qui existe. Environ 1 petite évolution par trimestre.

- Ajustement d'un gabarit de page existant
- Modification ou ajout de formulaires en ligne
- Petits ajustements UX ou graphiques
- Amélioration du moteur de recherche (filtres, résultats)
- Mise à jour mentions légales ou politique de confidentialité

Palier 2 — Standard · 30 jours · 30 000 CHF/an

Profil : Enrichir régulièrement la plateforme. Environ 1 à 2 évolutions par mois.

En plus du palier 1 :

- Intégration d'un outil tiers (Culturoscope, agenda externe, sondage)
- Nouveau gabarit de page ou nouvelle section

- Amélioration des circuits de validation et de publication
- Amélioration du module de newsletter
- Nouvelles règles d'archivage automatisé
- Nouvelles langues ou amélioration de la traduction dynamique

Palier 3 — Avancé · 40 jours · 40 000 CHF/an

Profil : Feuille de route digitale active. Environ 2 à 3 évolutions par mois.

En plus du palier 2 :

- Module de prise de rendez-vous pour les démarches citoyennes
- Site satellite (culturel ou événementiel) connecté au site principal
- Refonte d'une section majeure (espace élu, espace presse)
- Archivage horodaté automatisé des publications obligatoires
- Tableau de bord de suivi des audiences personnalisé

Palier 4 — Premium · 50 jours · 50 000 CHF/an

Profil : Transformation numérique ambitieuse. Environ 4 évolutions par mois ou plusieurs chantiers en parallèle.

En plus du palier 3 :

- Module d'aide à la rédaction par IA (SEO, relecture, suggestions)
- Développement de sites satellites supplémentaires
- Gouvernance éditoriale avancée (rôles, circuits de validation complexes)
- Intégrations supplémentaires avec d'autres systèmes communaux
- Personnalisation avancée de l'expérience selon les profils (citoyen, élu, média, partenaire)

Récapitulatif commercial

Maintenance évolutive seule

Palier	Jours/an	Annuel CHF	Sur 4 ans CHF
Essentiel	20 jours	20 000	80 000
Standard	30 jours	30 000	120 000
Avancé	40 jours	40 000	160 000
Premium	50 jours	50 000	200 000

Combiné : correctif + évolutif (48 000 CHF/an base corrective)

Palier	Évolutive	Corrective	Total annuel	Total 4 ans
Essentiel	20 000	48 000	68 000	272 000
Standard	30 000	48 000	78 000	312 000
Avancé	40 000	48 000	88 000	352 000
Premium	50 000	48 000	98 000	392 000

Conditions financières (communes aux deux contrats)

- Facturation mensuelle selon calendrier fixe.
- Paiement : 30 jours à date de réception de la facture.
- Tarif fixe sur 4 ans, quelle que soit l'évolution du marché.
- Palier évolutif révisable à la hausse ou à la baisse en début de chaque année de renouvellement, d'un commun accord.
- Validité de l'offre : 90 jours.
- En cas de résiliation : plan de transfert de 3 à 4 mois (documentation, code source, historique des incidents et évolutions).

Matrice des risques

Risque	Probabilité	Impact	Mesures de mitigation
Retards de validation	Moyenne	Moyen	Jalons clairs, livrables intermédiaires, suivi régulier
Contraintes techniques SIEN	Moyenne	Moyen	Tests anticipés, coordination SIEN
Risques liés à la migration	Moyenne	Élevé	Plan de migration, redirections 301, tests et sauvegardes
Performance du site	Moyenne	Élevé	Tests de charge, cache, optimisation front/back
Protection des données	Faible	Élevé	Droits d'accès, minimisation des données, audit sécurité
Dépassement budget / planning	Moyenne	Faible	Suivi des charges, backlog priorisé, méthode agile

Matrice RACI

Responsible
Accountable
Consulted
Informed

Phase 1 - Stratégie

	Teïcir Bouaziz **Cheffe de projet**	Gabriel Cappai **Développeur**	Nuno Amaro **UX/UI**	Sasita Hobi **Rédacteur Web**	Tanguy Vaucher **DevOpps - Expert Sécurité - Teseur**	Ville de la Chaux-de-Fonds
Analyse du site & KPI	A	C	C	R	C	I
Audit technique & SEO	C	R	C	R	A	I
Définition stratégie & vision	A	C	R	R	C	A
Personas & parcours utilisateurs	C		R	A		I
Arboresecence & architecture info	A	C	R	C		A
Gouvernance éditoriale	A		C	R	C	I

Matrice RACI

Responsible
Accountable
Consulted
Informed

Phase 2 - UX/UI

	Teïcir Bouaziz **Cheffe de projet**	Gabriel Cappai **Développeur**	Nuno Amaro **UX/UI**	Sasita Hobi **Rédacteur Web**	Tanguy Vaucher **DevOpps - Expert Sécurité - Teseur**	Ville de la Chaux-de-Fonds
Architecture technique	A	R	C		C	I
Types de pages	C		R	A		I
Charte graphique			R	C		A
Charte éditoriale	C		C	R		A
Design system		C	R			I
Maquettes			R	C		A
Validation UX/UI	A	C	R	C		A

Matrice RACI

Responsible
Accountable
Consulted
Informed

Phase 3 - Développement

	Teïcir Bouaziz **Cheffe de projet**	Gabriel Cappai **Développeur**	Nuno Amaro **UX/UI**	Sasita Hobi **Rédacteur Web**	Tanguy Vaucher **DevOpps - Expert Sécurité - Teseur**	Ville de la Chaux-de-Fonds
Installation CMS	C	R			A	I
Développement		R	C	C	A	I
Intégration UI		R	A			I
SEO technique	C	R		A	C	I
Sécurité & performance		C			A	I
Tests	C	R			A	I
Recette utilisateur	A	C	R	R		A
Migration contenus	C	R		A	C	I
Mise en production	A	R			A	I

Matrice RACI

Responsible
Accountable
Consulted
Informed

Phase 4 - Performance

	Teïcir Bouaziz **Cheffe de projet**	Gabriel Cappai **Développeur**	Nuno Amaro **UX/UI**	Sasita Hobi **Rédacteur Web**	Tanguy Vaucher **DevOpps - Expert Sécurité - Teseur**	Ville de la Chaux-de-Fonds
SEO	C	C		R	A	I
Analytics	A	R		C	C	I
Performance	C	R	C		A	I

Matrice RACI

Responsible
Accountable
Consulted
Informed

Phase 5 - Maintenance

	Teïcir Bouaziz **Cheffe de projet**	Gabriel Cappai **Développeur**	Nuno Amaro **UX/UI**	Sasita Hobi **Rédacteur Web**	Tanguy Vaucher **DevOpps - Expert Sécurité - Teseur**	Ville de la Chaux-de-Fonds
Incidents	A	R			A	I
Maintenance	C	R			A	I
Évolutions	A	R	C	C	C	I

Phase 1 - Création & Stratég

Tâches

1. Analyse & KPIs

Collecte et analyse données actuelles

Audit du site existant
Définition des KPI stratégiques

Livrables

2. Rapport de vision & Stratégie

matrice force/faiblesses du site LCDF
Définir les critères du nouveau site
Faire valider par le COPIL

Livrables

TOTAL Phase 1

ie

Description

Extraction Google Analytics : trafic 96-123k visites/mois, top pages (événements 15%, emplois top 3), taux rebond, parcours populaires, pics saisonniers (fête mai, élections), recherches internes.
Analyse technique de l'existant afin d'identifier les limites actuelles et orienter la conception du nouveau site (volumétrie, PDF, performances, SEO technique, mobile/desktop).
Fixer 8-10 KPIs mesurables (taux conversion démarches (80%), temps/session

Rapport de collecte & analyse des données
Dashboard de suivi des performances
Audit complet du site existant (UX, technique, SEO, contenu)
Document de définition des KPIs stratégiques

SWOT site actuel : Forces, Faiblesses, Opportunités , Menaces.
Spécifications cibles (2-3 clics max, responsive, WCAG 2.2 AA, multilingue
Présenter rapport vision (15 slides) au COPIL (Chancellerie, Com, IT, SIEN),

Matrice SWOT du site existant
Vision stratégique + spécifications fonctionnelles
Arborescence cible
Présentation COPIL

Profil	Charges	TJM (HT)	Total
			6 600,00 CHF
CDP			
	2	CHF 1 200,00	**2 400,00 CHF**
DEV			
	3	CHF 1 100,00	**3 300,00 CHF**
UX	1	CHF 900,00	**900,00 CHF**

			6 000,00 CHF
CDP	1	CHF 1 200,00	**1 200,00 CHF**
CDP	2	CHF 1 200,00	**2 400,00 CHF**
CDP	2	CHF 1 200,00	**2 400,00 CHF**

12 600,00 CHF

1j = 8h de travail

0,5 = 4h00

0,25 = 2h00

Profils		TJM
Teicir	Chef de Projet => CDP Product owner => PO	1'200
Nuno	UX Designer => UX UI Designer => UI	900
SASITA	Redactrice Web => RWEB	800
Tanguy	DevOps => DOPS Expert securite => SEC Bêta testeur => TEST	1'100
Gabriel	Developpeur => DEV	1'100

Phase 2 - Design & Création

Tâches

1. Architecture de l'info technique

Finaliser l’architecture de l’information
Lister les types de pages et de contenus
Décrire ce qu’on met dans chaque type de page

Livrables

2. Recherche utilisateurs & Parcours UX

Recherches infos sur les utilisateurs
Création des personas
Définir parcours utilisateurs

Livrables

3. Charte éditoriale

Charte éditoriale & cohérence des contenus
Guide d’identité visuelle et éditoriale

Livrables

4. Conception UI & Prototypage

Moodboard
UserFlow
Design system
Maquette
Prototype interactif
Atelier de validation UX/UI avec la Ville
Test utilisateurs + corrections + améliorations

Livrables

TOTAL Phase 2

UX / UI

Description	Profil
Arborescence optimisée du site : portail principal (démarches, actualités,	UX
Décider quels “types de pages” existent (démarche, actualité, événement, offre	UX
Pour chaque type (ex. une démarche), lister simplement les informations à	UX
Sitemap détaillé	
Modèles de pages & contenus	
Interviews/ateliers 10-15 personnes : citoyens (démarches), élus (conseil),	UX
5-7 personas détaillés => groupes d'utilisateurs (en fonction du comportement,	UX
Mapper 8 parcours prioritaires : démarche admin, offre emploi, agenda	UX
Personas détaillés	
Parcours utilisateurs	
Définition des règles éditoriales de la Ville : ton rédactionnel (institutionnel et	RWEB
Rédaction d’un guide opérationnel à destination des équipes, définissant les	RWEB
Charte éditoriale	
Guide éditorial	
Création d’un moodboard regroupant des inspirations visuelles (couleurs,	UI
Concevoir les parcours utilisateurs clés (User Flow) pour structurer la	UI
Préparer dans un outil de design tous les éléments réutilisables : styles de	UI
Concevoir une homepage vivante combinant contenus éditoriaux choisis et	UI
Transformation des maquettes en prototype cliquable pour tester et valider les	UI
Présenter design system et maquettes au COPIL/Com/IT, collecter retours,	UI
Réaliser des tests utilisateurs afin de pouvoir voir ce qui fonctionne bien et	UX
Moodboard Figma	
UserFlow Figjam	
Design System Figma	
Maquette Figma + Prototype intéractif	
Présentation pour l'atelier avec la ville	

Charges	TJM (HT)	Total
		5400
3	900	**2700**
2	900	**1800**
1	900	**900**

		6 300,00 CHF
3	CHF 900,00	**2 700,00 CHF**
1	CHF 900,00	**900,00 CHF**
3	CHF 900,00	**2 700,00 CHF**

		3200
2	800	**1600**
2	800	**1600**

		27000
1	900	**900**
3	900	**2700**
8	900	**7200**
10	900	**9000**
4	900	**3600**
2	900	**1800**
2	900	**1800**

41 900,00 CHF

Phase 3 - Implémentation technique

Tâches	Description
1. Mise en place de la plateforme CMS	
Définir l'architecture technique	Définition d'une architecture technique open source basée sur un CMS
Installer le CMS chez SIEN	Installer Drupal headless sur les 3 environnements (dev, préprod, prod)
Configurer les fondations CMS	Gestion multilingue, organisation des contenus (taxonomies,
Intégrer les gabarits et du design system	Intégration des templates et pages types à partir des maquettes Figma
Migration des contenus existants	Migration des contenus existants à partir de fichiers structurés (CSV,
Livrables	CMS configuré (multilingue, rôles, permissions, workflows
	Templates de pages intégrés et fonctionnels
	Site fonctionnel en environnement de préproduction
2. Sécurité, performance, conformité	
Mise en place des certificats SSL et sécurisation	HTTPS forcé, hardening CMS, rôles granulaires, audit sécurité
Optimiser performances	Mise en place d'un système de cache (Redis/Varnish), optimisation
Conformité accessibilité WCAG 2.2 AA	Vérification et mise en conformité du site selon les standards WCAG
Optimisation SEO technique	Génération du sitemap XML, configuration du fichier robots.txt, ajout
Livrables	Plateforme CMS sécurisée, performante, accessible et conforme
3. Gestion des rôles & Workflow CMS	
Implémenter les rôles et droits	Définition d'une matrice de rôles et permissions adaptée à
Configurer le workflow CMS	Paramétrer Drupal : states (draft/pending/published), transitions
Livrables	Matrice des rôles et droits utilisateurs (contributeurs, modérateurs, adm
	Configuration du workflow CMS Drupal
4. Développement des fonctionnalités	
Outil d'assistance à l'accessibilité	Installation d'un plugin Drupal d'assistance à l'accessibilité (interface utilisateur optionnelle), en complément de la conformité native WCAG 2.2 AA
Gestion des préférences des cookies	Mise en place d'un système de gestion des préférences cookies

API services tiers	Connexion du site à des services externes utiles aux citoyens et
Intégration, création et optimisation des médias	Migration des médias existants (photos/vidéos), mise en place d'un
Construire la recherche avancé	Conception et développement d'un moteur de recherche avancée dans
Option : IA Custom	Mise en place d'un assistant IA basé sur un LLM personnalisé, entraîné
Développer news / articles	Création et configuration d'un type de contenu "News / Articles" dans
Mettre en place archivage automatique	Configuration d'un mécanisme d'archivage automatique des contenus
Configurer Newsletter	Intégration et configuration d'une solution de newsletter avec Brevo,
Développer l'agenda dynamique / gestions événements	Conception et intégration d'un agenda dynamique dans Drupal
Mettre en place fonctionnalité de prise de rdv via calendrier	Conception et intégration d'un module de prise de rendez-vous dans
Mettre en place les formulaires	Conception et intégration de formulaires en ligne dans Drupal, avec
Fonctionnalité de sondages	Mise en place d'une fonctionnalité de sondage dans Drupal permettant
Livrables	Site web avec modules fonctionnels intégrés (accessibilité, cookies, Vidéo drone réalisée et intégrée Assistant IA personnalisé intégré Newsletter Brevo intégrée

5. Tests & Validation	
Tests unitaires fonctionnalités	Vérification du bon fonctionnement de chaque fonctionnalité de
Tests utilisateurs avec la Ville	organisation des sessions avec 10 contributeurs sur des parcours
Tests de performance et de charge	Simulation de scénarios de charge afin de valider les performances du
Tests de sécurité et de conformité	Réalisation de tests de sécurité et de conformité incluant des audits de
Validation finale et préparation à la mise en production	Pilotage de la phase de recette par le chef de projet : organisation des
Livrables	Rapports de tests (fonctionnels, utilisateurs, performance, sécurité) Suivi des anomalies corrigées Site validé en préproduction PV de recette signé Plan de mise en production

6. Formation & Documentation	
Former les contributeurs (session 3h)	Formation pratique à la création de contenus dans le CMS : rédaction

Former modérateurs (session 2h)	Formation à la validation des contenus : contrôle qualité,
Former administrateurs (session 4h)	Formation avancée à l'administration du CMS : gestion des utilisateurs
Sensibilisation à la sécurité (session 2h)	Session dédiée aux bonnes pratiques de sécurité : gestion des accès,
Option : Coaching individuel personnalisé	Sessions de coaching à la demande pour accompagner des utilisateurs
Sous-domaine de documentation administrateur	Mise en place d'un sous-domaine dédié (doc.chaux-de-fonds.ch),
Option : Vidéos explicatives	Création de tutoriels vidéo démontrant la prise en main du CMS et des
Assistant IA	Intégration de l'assistant IA Chrony (LLM du site), permettant de
Livrables	Sessions de formation (contributeurs, modérateurs, administrateurs,
	Sous-domaine de documentation d'exploitation du site
7. Mise en production	
Mise en production du site	Déploiement Octopus Deploy, bascule DNS, monitoring de 48h post-
Suivi et garantie 12 mois	Outil de ticketing Jira (P0/P1/P2) et plateforme de monitoring
Livrables	Site en production
	Plateforme interne de monitoring
	Plateforme interne de ticketing

TOTAL Phase 3

Profil	Charges	TJM (HT)	Total
			15950
DEV	2,5	1100	**2750**
DEV	3	1100	**3300**
DEV	4	1100	**4400**
DEV	3	1100	**3300**
DEV	2	1100	**2200**

			8300
DEV	2	1100	**2200**
DEV	2	1100	**2200**
UX	2,5	900	**2250**
DEV	1,5	1100	**1650**

			6 600,00 CHF
DEV	3	CHF 1 100,00	**3 300,00 CHF**
DEV	3	CHF 1 100,00	**3 300,00 CHF**

ıins)

			58300
DEV			
	0,5	1100	**550**
DEV	1,5	1100	**1650**

DEV	2	1100	**2200**
DEV	6	1100	**6600**
DEV	5	1100	**5500**
DEV	20	1100	**22000**
DEV	2,5	1100	**2750**
DEV	2	1100	**2200**
DEV	1	1100	**1100**
DEV	4	1100	**4400**
DEV	3	1100	**3300**
DEV	2,5	1100	**2750**
DEV	3	1100	**3300**

			13150
DOPS	3	1100	**3300**
UX	4	900	**3600**
DOPS	1,5	1100	**1650**
DOPS	2	1100	**2200**
CDP	2	1200	**2400**

			23500
RWEB	0.5	800	**400**

DEV	0.5	1100	**550**
DEV	1	1100	**1100**
DOPS	0,5	1100	**550**
RWEB/DEV/DOPS	/	/	**Sur demande**
DEV	15	1100	**16500**
RWEB	/	/	**Sur demande**
DEV	4	1100	**4400**

			2200
DEV	2	1100	**2200**
DOPS	OFFERT	OFFERT	**0.00**

128 000,00 CHF

Phase 4 - Marketing & Perform

Tâches

1. Optimisation SEO
Optimisation des pages hors contenus éditoriaux
Mise en place des outils SEO
Livrables

2. Plan de tags & Dashboard
Définition du plan de taggage
Implémentation du tracking
Intégration de Matomo dans le site Drupal
Configuration des dashboards analytics
Livrables

3. Performance du site
Audit performance
Optimisation front-end
Optimisation back-end
Livrables

TOTAL Phase 4

ıance

Description	
Optimisation des contenus des pages hors contenus éditoriaux (pages institutionnelles), incluant Intégration d'un plugin Drupal d'aide à la rédaction SEO, permettant d'accompagner les contributeurs	
Pages sites optimisés avec SEO Plugin d'optimisation SEO intégré dans Drupal	
Identification des événements clés à suivre (clics, formulaires, conversions), structuration du plan de Intégration technique du plan de taggage via un gestionnaire de balises (Tag Manager), incluant la Connexion de l'outil Matomo au site Drupal, incluant l'installation des scripts de tracking, la vérification Configuration de tableaux de bord personnalisés dans Matomo, incluant les principaux indicateurs de	
Plan de taggage documenté Tracking implémenté via Tag Manager Connexion de Matomo au site Drupal Tableaux de bord analytiques Matomo	
Analyse des performances du site incluant les temps de chargement, le poids des pages et Optimisation des performances côté client (minification des fichiers CSS et JavaScript, cache) Optimisation des performances côté serveur : mise en place de mécanismes de cache, optimisation	
Rapport d'audit de la performance du site Front-end optimisé Back-end optimisé	

Profil	Charges	TJM (HT)	Total
			1350
RWEB	1	800	**800**
DEV	0.5	1100	**550**

			4750
UX	1	900	**900**
DEV	2	1100	**2200**
DEV	0,5	1100	**550**
DOPS	1	1100	**1100**

			3100
DOPS	1	1100	**1100**
DEV	1	900	**900**
DEV	1	1100	**1100**

9 200,00 CHF

Phase 5 - Support & Maintenance

Support	Description	Prise en compte	Résolution
P0 — Critique	Site totalement inaccessible ou faille de sécurité majeure	4 heures ouvrées	**24 heures**
P1 — Majeure	Fonctionnalité principale dégradée, fort impact utilisateurs	8 heures ouvrées	**72 heures**
P2 — Mineure	Problème mineur, contournement possible	8 heures ouvrées	**1 semaine**

Maintenance corrective	Détail	Montant
Capacité mensuelle	4 jours × 1 000 CHF/jour	**4 000 CHF / mois**
Forfait annuel	4 000 CHF × 12 mois	**48 000 CHF**
Forfait sur 4 ans	Tarif fixe	**192 000 CHF**

Combiné : correctif + évolut	Évolutive	Corrective	Total annuel
Essentiel	20'000	48'000	68'000
Standard	30'000	48'000	78'000
Avancé	40'000	48'000	88'000
Premium	50'000	48'000	98'000

TOTAL Phase 5

48 000 CHF / an (base corrective)

Total pour 4 ans
242'000
282'000
322'000
292'000

Total de l'offre (phases 1-4)

SOUS-TOTAL HT					191700
TVA (8,1%)					15527,7
TOTAL TTC					**207227,7**

Options

TITRE	DETAILS	PROFILS	CHARGE (J)	TJM (CHF)	TOTAL (CHF)
Coaching individuel personnalisé	Sessions personnalisées	RWEB/DEV/DOPS	/	/	Sur devis
Assistant IA personnalisé	LLM entraîné	DEV	20	1'100	22'000
Vidéo drone	Réalisation + intégration	Externe/DEV	/	/	6'600
Vidéos tutoriels CMS	Volume à définir	RWEB	/	/	Sur devis
SOUS-TOTAL HT					28'600
TVA (8,1%)					2’316.60
TOTAL TTC					30’916.60

BON POUR ACCORD

Nom | Lieu / Date | Signature

**Annexes : contrat de maintenance (phase 5), offre commerciale*

LCDF Site Web Rebuild

KOMA

Début du projet : lun, 5.18.2026

Semaine d'affichage : 1

TÂCHE	ATTRIBUÉ À	AVANCEMENT	DÉBUT	FIN
Phase 1 - Création & Stratégie			**18.5.26**	**1.6.26**
Analyse des KPIs			18.5.26	25.5.26
Rapport de vision et stratégie			26.5.26	1.6.26
Phase 2 - Design & Création UX / UI			**2.6.26**	**5.8.26**
Architecture de l'info technique			2.6.26	9.6.26
Recherche utilisateurs & parcours UX			10.6.26	18.6.26
Charte éditoriale			19.6.26	24.6.26
Conception UI et prototypage			25.6.26	5.8.26
Phase 3 - Implémentation technique			**6.8.26**	**28.12.26**
Mise en place de la plateforme CMS			6.8.26	4.8.26
Sécurité, performance, conformité			5.8.26	18.8.26
Gestion des rôles et workflow CMS			19.8.26	26.8.26
Développement des fonctionnalités			27.8.26	9.11.26
Tests et validation			10.11.26	25.11.26
Formation & Documentation			25.11.26	24.12.26
Mise en production			25.12.26	28.12.26
Phase 4 - Maketing & Performance			**29.12.26**	**8.1.27**
Optimisation SEO			29.12.26	30.12.26
Plan de tags & Dashboard			30.12.26	5.1.27
Performance du site			6.1.27	8.1.27

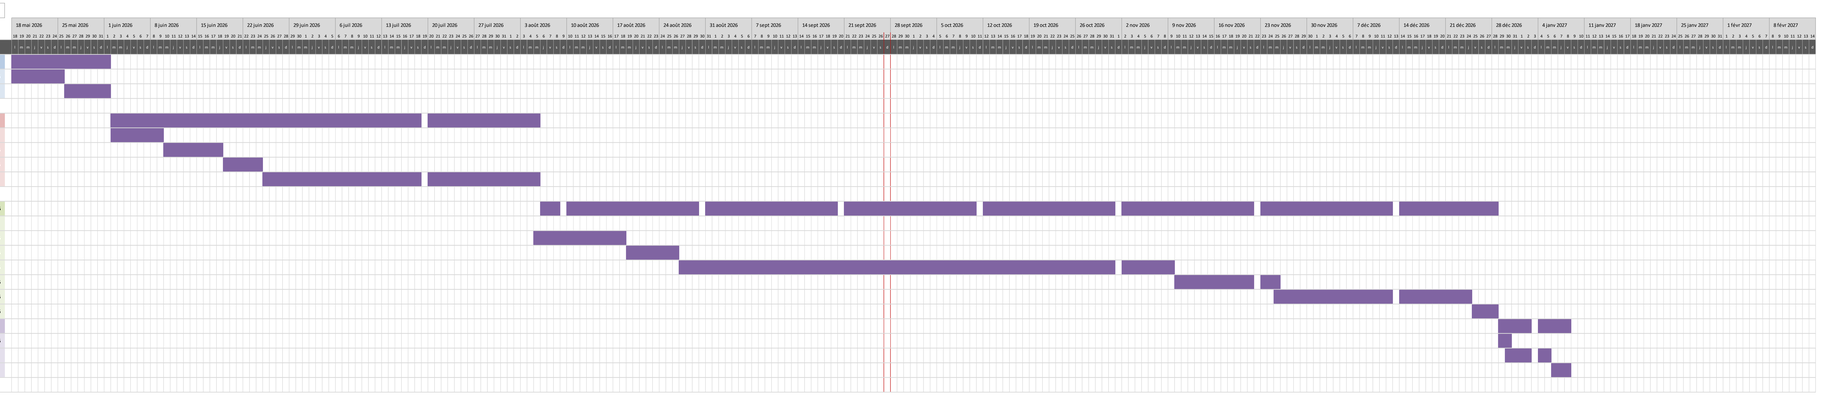

Semaine d'affichage : 1

TÂCHE	ATTRIBUÉE À	AVANCEMENT	DÉBUT	FIN
insérez les nouvelle lignes au-dessus de celle-ci.				

URL Canva / Figma / ETC :

Présentation : https://canva.link/komapresentationappeloffrelcdf
Maquette Figma : https://www.figma.com/design/pgtdMrwcgc0uvnR3NMGhdx/Maquette-Chaux-de-Fonds?node-id=0-1&t=NtCsbfI22DdmXQ76-1
